

LYBTZYZS 统一执行计划

Created: 2026-04-20 **Status:** Ready for Execution **Merges:** 2026-03-31-service-split-refactoring.md + 2026-04-11-post-refactoring-todo-plan.md **Supersedes:** Both prior plans (to be archived upon execution start)

概览

层	内容	任务数	预估工时
Wave 0: 紧急修复	失败测试 + UI Bug + 数据丢失	3	~1.5h
Wave 1: 架构拆分 (Server)	AuthService/UserService 拆分	5	~9h
Wave 2: Desktop 修复	UI 绑定 + 数据流修复	5	~7h
Wave 3: 体验增强	望闻问切 + 操作栏 + 价格计算	6	~12h

总计: 19 任务, 约 29.5 小时

Wave 0: 紧急修复 (P0)

前置条件：无。可并行执行。

W0-1: 修复 PendingQueue 测试失败

属性	值
问题	<code>SelectPendingCaseAsync_...SkipsSuspend_NavigatesDirectly</code> 因未 Mock <code>CommonDialogService</code> 导致失败
修复	Mock <code>IWorkspaceHost.CommonDialogService</code> → <code>ShowConfirmAsync</code> 返回 <code>true</code>
文件	<code>tests/LYBT.Tests.Desktop/PureLogic/Clinical/PendingQueueViewModelTests.cs</code>
工时	15 min
风险	低 — 仅测试修改
验证	<code>dotnet test tests/LYBT.Tests.Desktop/ --filter "PendingQueueViewModelTests"</code> → 5/5 pass

W0-2: 修复 LoginView HasMessage 不触发

属性	值
问题	<code>LoginViewModel.HasMessage</code> 的 <code>PropertyChanged</code> 永远不触发，用户看不到登录错误信息
修复	在 <code>LoginViewModel</code> 添加 <code>On_StatusCodeMessageChanged</code> / <code>On_ErrorMessageChanged</code> 触发 <code>HasMessage</code>
文件	<code>src/Client/Desktop/Core/LYBT.Desktop.Foundation/ViewModels/CoreViewModelBase.cs</code> 或 <code>LoginViewModel.cs</code>

属性	值
工时	30 min
风险	中 — 基类修改影响所有 VM，优先在 LoginViewModel 级别修复
验证	新测试 + 手动登录验证

W0-3: 修复 HerbInputDto 缺失 Properties 字段

属性	值
问题	HerbInputDto 缺少 Properties 字段，HerbMapper 忽略了该映射，导致药材创建/更新时数据丢失
修复	添加 Properties 字段 + 移除 <code>[MapperIgnoreSource(nameof(Properties))]</code>
文件	<code>HerbInputDto.cs</code> , <code>HerbMapper.cs</code>
工时	30 min
风险	中 — API 契约变更，需验证 Server + Desktop
验证	<code>dotnet test tests/LYBT.Tests.Server/ --filter "Herb"</code> + Desktop 测试

Wave 0 验收门: 全部测试通过 (`dotnet test tests/LYBT.Tests.Desktop/` + `dotnet test tests/LYBT.Tests.Server/ --filter "Herb"`)

Wave 1: Server 架构拆分 (SRP)

前置条件：Wave 0 完成。任务按依赖顺序串行执行。

W1-1: 拆分 AutoLoginService

属性	值
目标	从 AuthService (493行) 提取 AutoLogin 逻辑
新文件	LYBT.Module.Auth/Interfaces/IAutoLoginService.cs , LYBT.Module.Auth/Services/AutoLoginService.cs
修改	AuthService.cs , AuthModule.cs
工时	2h
验证	新增 AutoLoginService 单元测试 + 全量 Auth 测试通过

W1-2: 创建 RefreshTokenRepository

属性	值
目标	替代 AuthService/AutoLoginService 中直接使用 AppDbContext
新文件	IRefreshTokenRepository.cs , RefreshTokenRepository.cs , IAutoLoginTokenRepository.cs , AutoLoginTokenRepository.cs
修改	AuthService.cs , AutoLoginService.cs , AuthModule.cs
工时	2h
依赖	W1-1

属性	值
验证	AuthService 无直接 AppDbContext 注入 + 测试通过

W1-3: 拆分 UserQueryService

属性	值
目标	从 UserService (587行) 提取查询逻辑
新文件	<code>LYBT.Module.Users/Interfaces/IUserQueryService.cs</code> , <code>LYBT.Module.Users/Services/UserQueryService.cs</code>
修改	<code>UserService.cs</code> , <code>UsersModule.cs</code>
工时	2h
验证	新增 UserQueryService 单元测试

W1-4: 拆分 UserPasswordService

属性	值
目标	从 UserService 提取密码逻辑 (ResetPassword, ValidatePassword, ChangePassword)
新文件	<code>IUserPasswordService.cs</code> , <code>UserPasswordService.cs</code>

属性	值
修改	<code>UserService.cs</code>
工时	2h
依赖	W1-3
验证	密码相关测试通过

W1-5: 拆分 UserStatusService

属性	值
目标	从 UserService 提取状态管理 (ToggleStatus, Restore)
新文件	<code>IUserStatusService.cs</code> , <code>UserStatusService.cs</code>
修改	<code>UserService.cs</code>
工时	1h
依赖	W1-3
验证	状态相关测试通过

Wave 1 验收门: - `dotnet test tests/LYBT.Tests.Server/` → 全部通过 - AuthService < 300 行, UserService < 300 行 - 架构测试验证无服务直接注入 AppDbContext

Wave 2: Desktop 修复与改进 (P1)

前置条件: Wave 0 完成。W2-1/W2-2/W2-5 可并行, W2-3/W2-4 依赖 W2-1。

W2-1: 修复 IsEnabled 作用域

属性	值
问题	MedicalCaseEditControl 的 IsEnabled 可能禁用整个控件而非单个字段
文件	MedicalCaseWorkspaceView.xaml , MedicalCaseEditControl.xaml
工时	1h
验证	手动测试：单个字段可独立切换

W2-2: 修复 EnterEditMode 绑定

属性	值
问题	EnterEditMode 命令在某些导航状态下失败
文件	MedicalCaseWorkspaceView.xaml , MedicalCaseWorkspaceViewModel.cs
工时	1h
验证	ReadOnly → Edit → Editing 状态正确切换

W2-3: 统一 Remark 数据源

属性	值
问题	Remark 字段在 Consultation 和 MedicalCase 层级数据源不一致
文件	MedicalCaseEditControl.xaml , ConsultationItem.cs
工时	2h
依赖	W2-1

W2-4: 添加验证错误显示

属性	值
目标	在 MedicalCaseEditControl 中显示验证错误 (INotifyDataErrorInfo)
文件	MedicalCaseEditControl.xaml , shared error styles
工时	2h
依赖	W2-1

W2-5: UserEditControl 添加 Remark 字段

属性	值
问题	用户编辑界面缺少 Remark 字段
文件	UserEditControl.xaml , UserEditControl.xaml.cs
工时	1h
验证	用户编辑 → Remark 可见可编辑 → 保存后持久化

Wave 2 验收门: `dotnet test tests/LYBT.Tests.Desktop/` → 全部通过 + 手动 UI 验证

Wave 3: 体验增强 (P2)

前置条件: Wave 2 完成。按依赖关系分组执行。

W3-1: 望闻问切诊断分区

属性	值
描述	按望闻问切四诊分组显示诊断字段

属性	值
工时	2h
依赖	W2-1, W2-3

W3-2: 处方操作引导

属性	值
描述	添加处方操作提示 (验方导入、历史复制等)
工时	2h

W3-3: 底部操作栏

属性	值
描述	MedicalCaseWorkspaceView 持久化底部操作栏 (保存/完成/打印/挂起)
工时	2h
依赖	W2-2

W3-4: 实时价格计算

属性	值
描述	处方药材实时总价计算显示
工时	2h

W3-5: 完整性检查指示器


属性	值
描述	必填字段填写状态可视化
工时	2h
依赖	W2-4

W3-6: 常用术语快速选择

属性	值
描述	常用中医诊断术语下拉/自动完成
工时	2h
依赖	W3-1

Wave 3 验收门: 全部测试通过 + 手动冒烟测试 (登录 → 选患者 → 建案 → 诊断 → 处方 → 完成)

依赖图

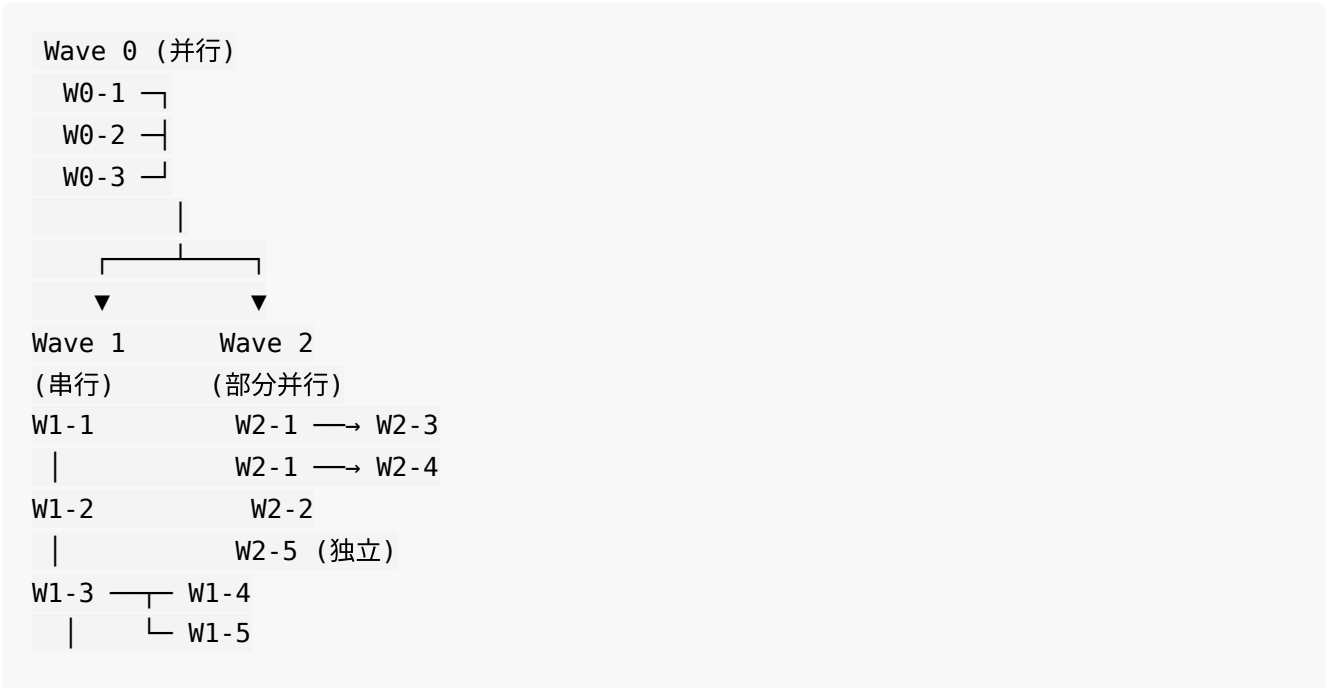



Wave 3
W3-1 (← W2-1, W2-3)
W3-2 (独立)
W3-3 (← W2-2)
W3-4 (独立)
W3-5 (← W2-4)
W3-6 (← W3-1)

文件冲突矩阵

文件	任务	执行顺序
MedicalCaseEditControl.xaml	W2-1, W2-3, W2-4, W3-1, W3-5, W3-6	严格串行
MedicalCaseWorkspaceView.xaml	W2-1, W2-2, W3-3	严格串行
AuthService.cs	W1-1, W1-2	严格串行
UserService.cs	W1-3, W1-4, W1-5	严格串行

最终验收标准

- [] dotnet build LYBTZYYS.sln — 0 errors
- [] dotnet test LYBTZYYS.sln — 全部通过 (2021+ tests, 0 failures)
- [] AuthService < 300 行, UserService < 300 行
- [] 无服务直接使用 ApplicationDbContext (架构测试验证)
- [] 手动冒烟测试通过: 完整临床工作流
- [] 无新增编译器警告

计划创建: 2026-04-20 合并自: 2026-03-31-service-split-refactoring.md + 2026-04-11-post-refactoring-todo-plan.md 预计总工时: ~29.5 小时
